
شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.



أمانة جدة

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
info@ramakcompany.com 0566157166 : إدارة 0544714479 : مدير المشاريع

المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
تقديم جديد ☑	مشروع تلال الغروب	
اعادة تقديم ☐	استمارة طلب تسليم رقم 23	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي :الامير فواز   رقم المخطط :BLOCK10   رقم الشارع : PED-B10-12   عرض الشارع: 9.8

استلام الطبقة :BOTTOM SUBGRADE   من محطة رقم :0+112.5   الى محطة رقم :253.09

اعمال اخرى : ☐

توقيع مهندس المشروع :   التاريخ : 2024 / 12 / 21

☐ المراقب   ☐ المساح   ☐ المختبر   توقيع المهندس المشرف :..............................

مرئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

شركة طرق الرياض للمقاولات المحدودة
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.
س.ت (1010294003)
مخطط تلال الغروب - جدة
بلوكات رقم
(13-12-11-10-5-3-1)

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه : ....   الي المحطه : ....

مرفقات :   ☐ القطاع الطولي   ☐ القطاع العرضي   ☐ اخري

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : ....   التوقيع: التاريخ : / /

من محطة :   الى محطة :

....   توقيع المساح :   التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد   ☐ مرفق   ☐ غير مرفق   قيمه البركتور :   الرطوبه المثلي :

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	رقم المحطة الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات

النتيجه :   ☐ ناجح   ☐ راسب   التوقيع : ....   التاريخ : / /

مكتب رمك للاستشارات الهندسية

ملاحظات   لوحظ وجود ارتفاع عند اضربن عن منسوب سلالم المدخل

تعليمات المهندس الاستشاري :   تم التشييك على ضرورة معالجة المناسب ST 225 To 250

☑ موافق   ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : ....   مندوب المقاول : ....   التوقيع : ....   التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات	

تقرير إستلام طبقة ردم

PED-B10-12	رقم الشارع :-	تلال الغروب	إسم المشروع :-	
140.59M	طول الشارع :-	BLOCK10	رقم المخطط :-	
9.8	عرض الشارع :-	BOUTTOM OF SUPGRADE-1	رقم الطبقة :-	

	WIDHT-R	4.900	LAYAER THICKNESS	0.150
	WIDHT-L	4.900	DEPTH FROM TOP SUB.G	0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L	C.L	R	CL width from L	CL width from R	H
SLOPE				1.00%	0.00%	0.50%			
11	112.5	529106.143	2369779.852	51.967	51.918	51.943	4.900	4.900	-0.167
12	125	529117.684	2369775.051	52.004	51.955	51.980	4.900	4.900	-0.177
13	137.5	529129.226	2369770.250	52.042	51.993	52.018	4.900	4.900	-0.238
14	150	529140.767	2369765.449	52.079	52.030	52.055	4.900	4.900	-0.136
15	150.27	529141.015	2369765.346	52.080	52.031	52.056	4.900	4.900	-0.131
16	162.5	529152.308	2369760.648	52.122	52.073	52.098	4.900	4.900	-0.246
17	175	529163.849	2369755.847	52.174	52.125	52.150	4.900	4.900	-0.211
18	175.27	529164.098	2369755.744	52.176	52.127	52.152	4.900	4.900	-0.207
19	187.5	529175.391	2369751.046	52.238	52.189	52.214	4.900	4.900	-0.199
20	200	529186.932	2369746.245	52.312	52.263	52.288	4.900	4.900	-0.155
21	200.27	529187.180	2369746.142	52.314	52.265	52.290	4.900	4.900	-0.152
22	212.5	529198.473	2369741.444	52.391	52.342	52.367	4.900	4.900	-0.193
23	225	529210.014	2369736.644	52.471	52.422	52.447	4.900	4.900	-0.113
24	237.5	529221.556	2369731.843	52.550	52.501	52.526	4.900	4.900	-0.024
25	250	529233.097	2369727.042	52.629	52.580	52.605	4.900	4.900	0.003
26	253.09	529235.949	2369725.855	52.649	52.600	52.625	4.900	4.900	-0.030

الإستشاري		المقاول
مكتب رمك للاستشارات الهندسية	يجب مراجعه منسوب خطه القطاع مع تناسب المباني	شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :- م حسام محمد		الإسم :- عبدالله حسن
التوقيع :-		التوقيع :-
التاريخ :-		التاريخ :-





BLOCK 10

FINISHING 0-10 CM

FINISHING 10-20 CM

FINISHING 20-30 CM

St. B10-1

St. B10-2

St. B10-3

St. B10-4

PED. B10-1 · PED. B10-2 · PED. B10-3 · PED. B10-4 · PED. B10-5 · PED. B10-6 · PED. B10-7 · PED. B10-8 · PED. B10-9 · PED. B10-10


PED. B10-11 · PED. B10-12 · PED. B10-13 · PED. B10-14 · PED. B10-16 · PED. B10-17 · PED. B10-18 · PED. B10-19 · PED. B10-20

PED. B10-21 · PED. B10-22 · PED. B10-23 · PED. B10-24 · PED. B10-25 · PED. B10-26 · PED. B10-27

N:2370000 · N:2369950 · N:2369900 · N:2369850 · N:2369800 · N:2369750 · N:2369700 · N:2369650 · N:2369600

E:528900 · E:528950 · E:529000 · E:529050 · E:529100 · E:529150 · E:529200 · E:529250 · E:529300 · E:529350

RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

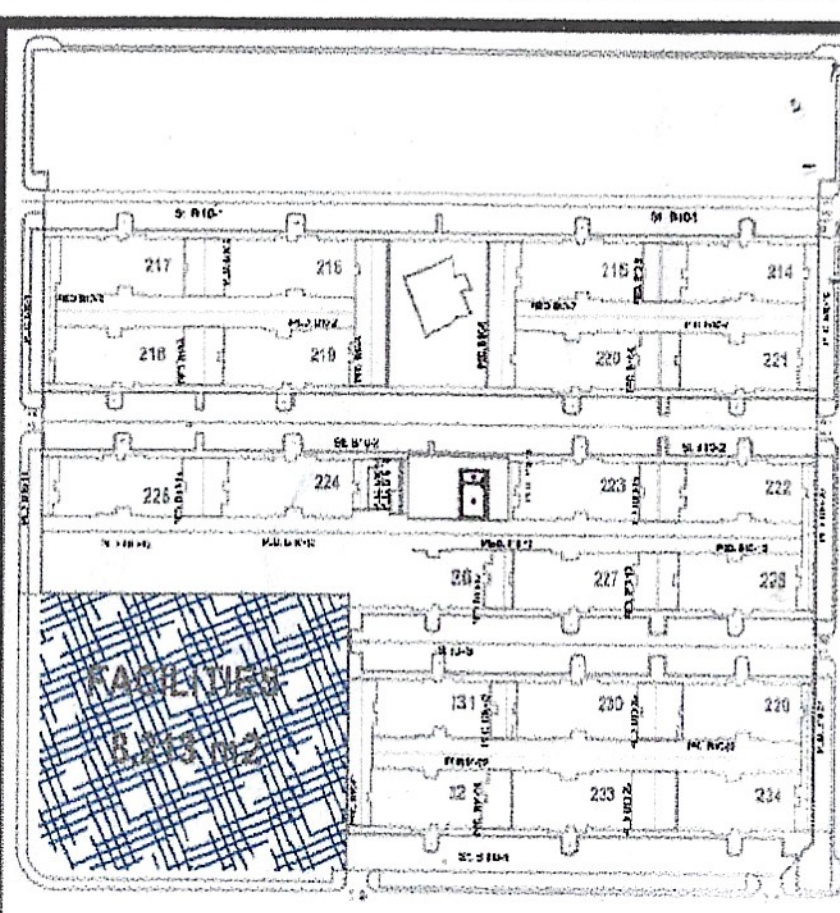

اتجاة تصريف المياة

الارض الطبيعية

الخط التصميمي

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحى الامير فواز شمال - مدينة جدة

مسح:	
رسم:	
تصميم:	
تدقيق:	
يعتمد:	
تاريخ:	
رقم اللوحة:	

NO.	22	SPOT ELEVATIONS PLAN	1:1500	مقياس الرسم:

مديرادارة تصميم الطرق · مديرعام الدراسات والتصاميم
